




St 2245 Ausbau Ortsdurchfahrt Vincenzenbronn


10. Juni 2025




- **Übersichtskarte**
- **Maßnahmenübersicht Vincenzenbronn**
- **Übersicht Einzelgewerke**
- **Übersicht Bauphasen**
- **Bauabschnittsplan**
- **Gesamtübersicht Umleitungen**
- **Umfahrung / Umleitungen**
- **Koordinierung TÖB**
- **Zusammenfassung | Übersicht der Bauzeiten**


Übersichtskarte

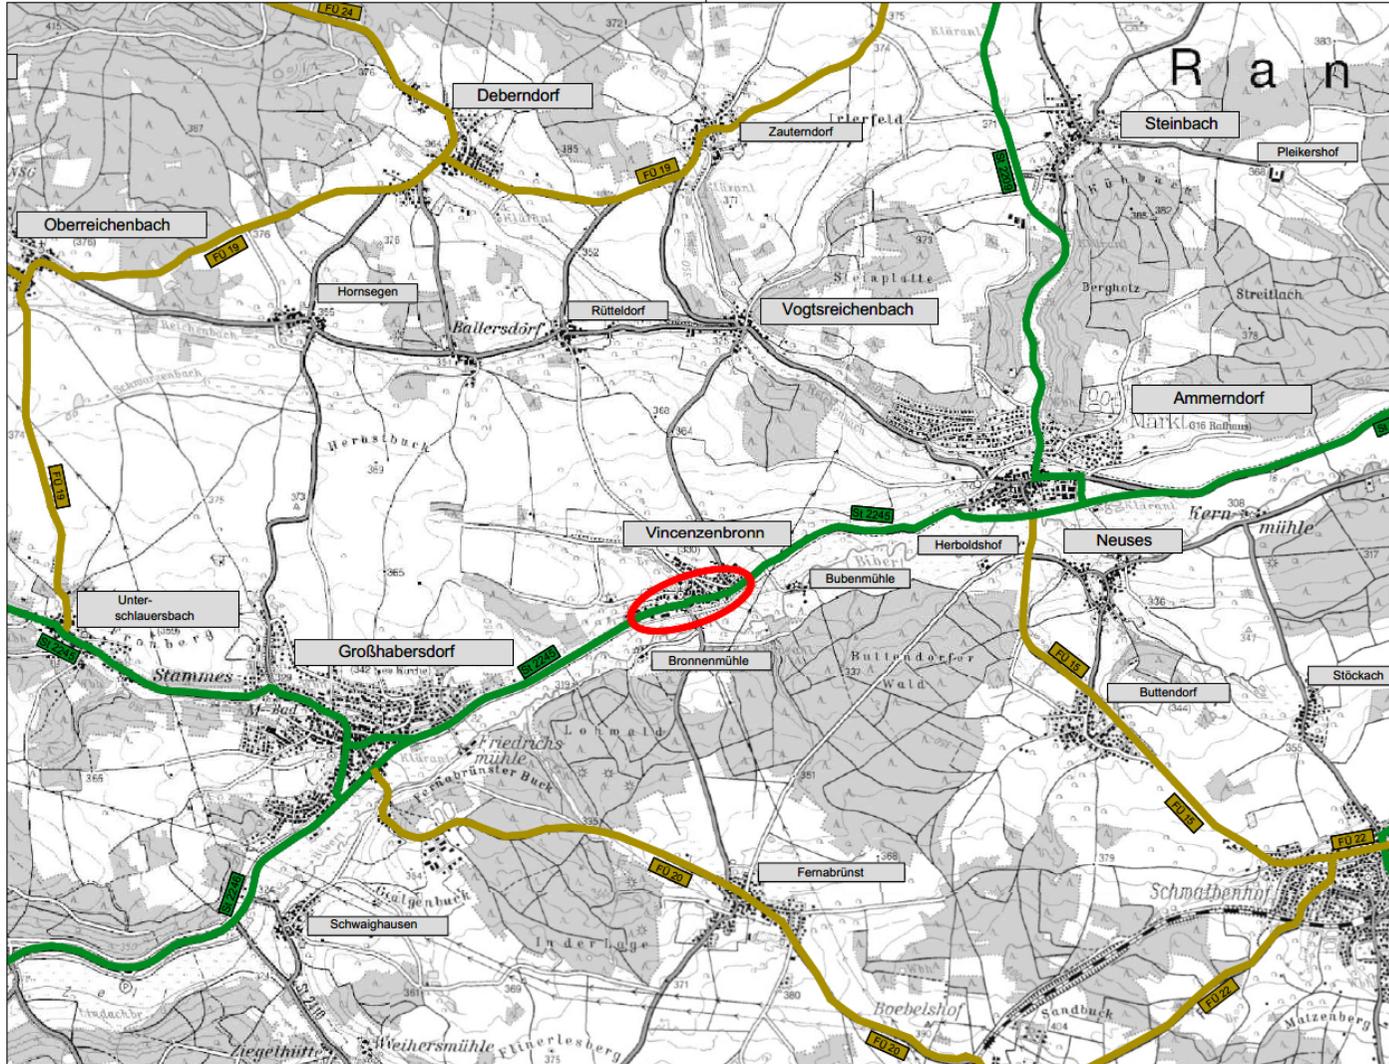


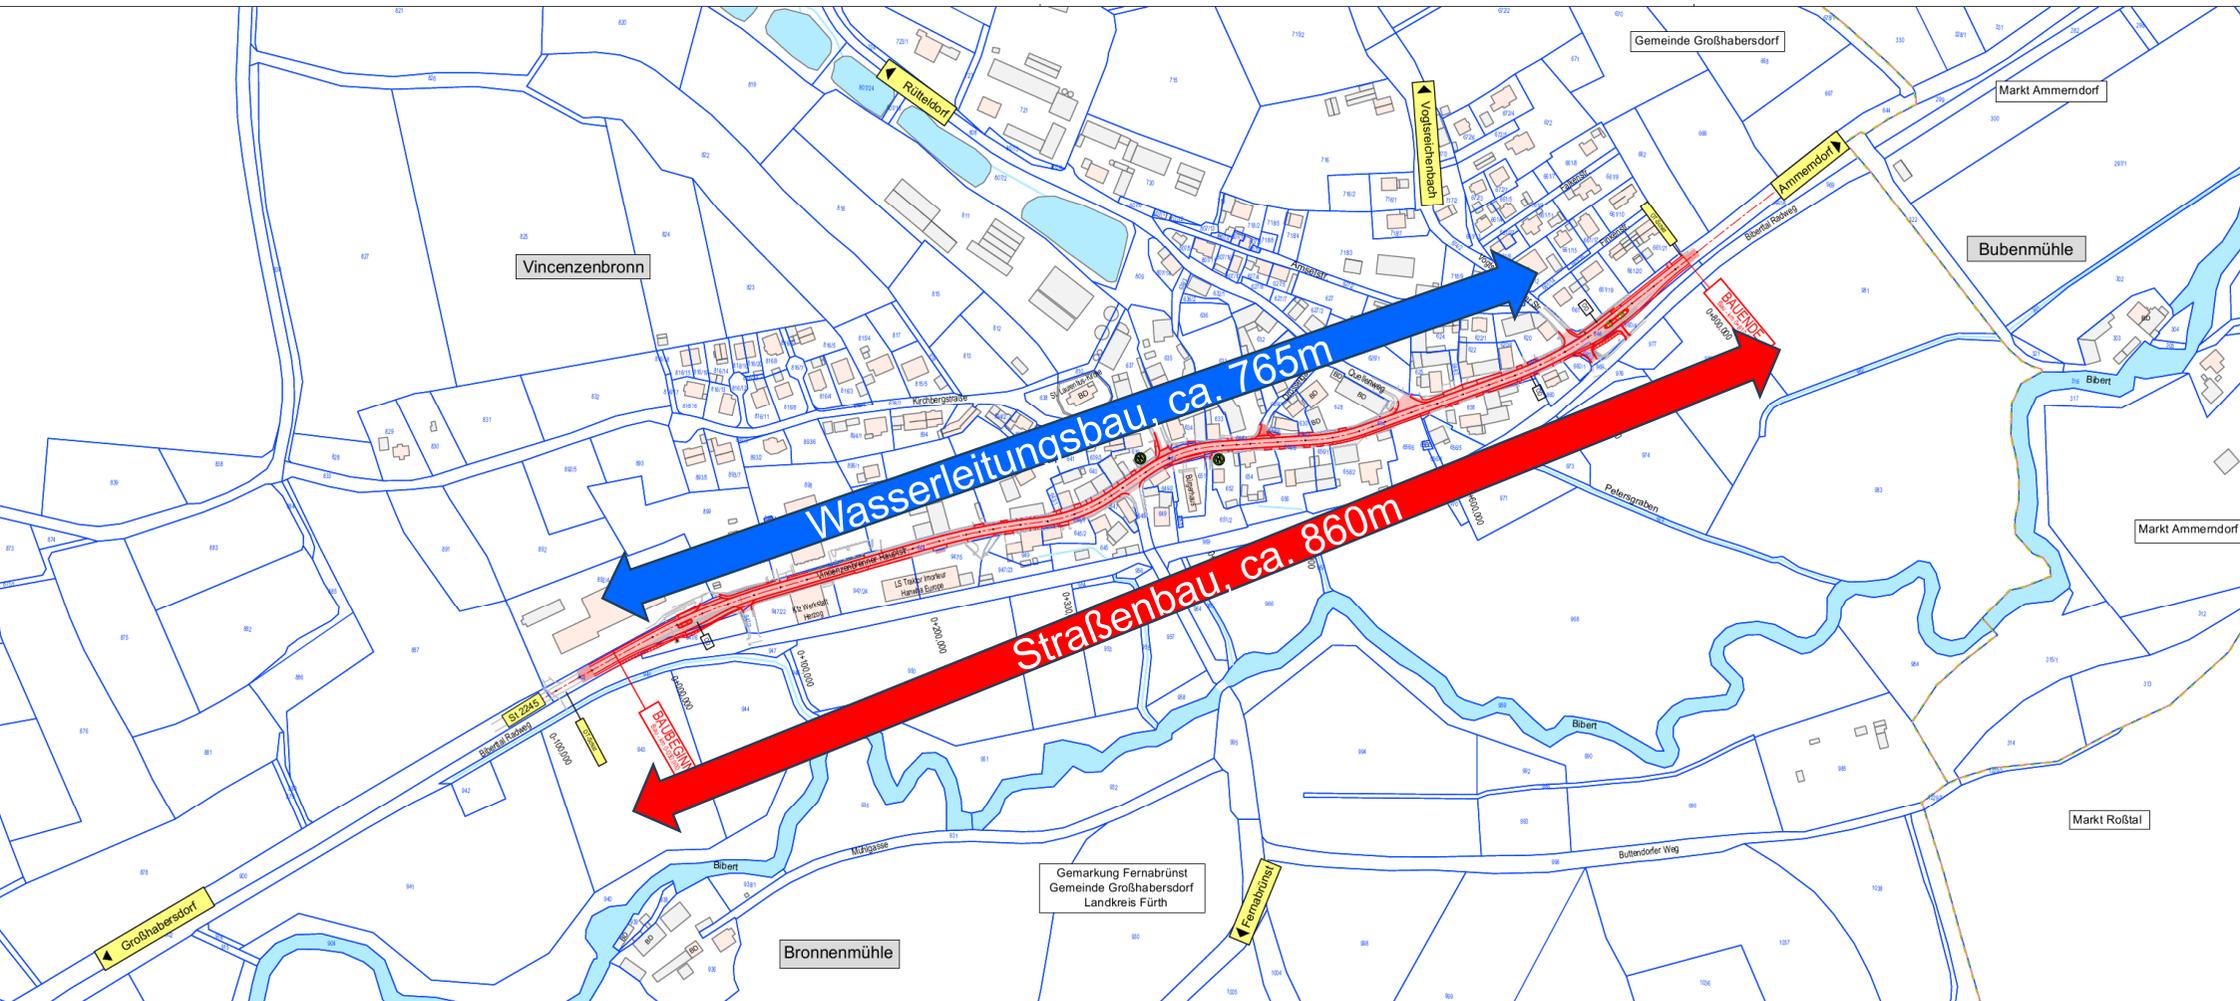


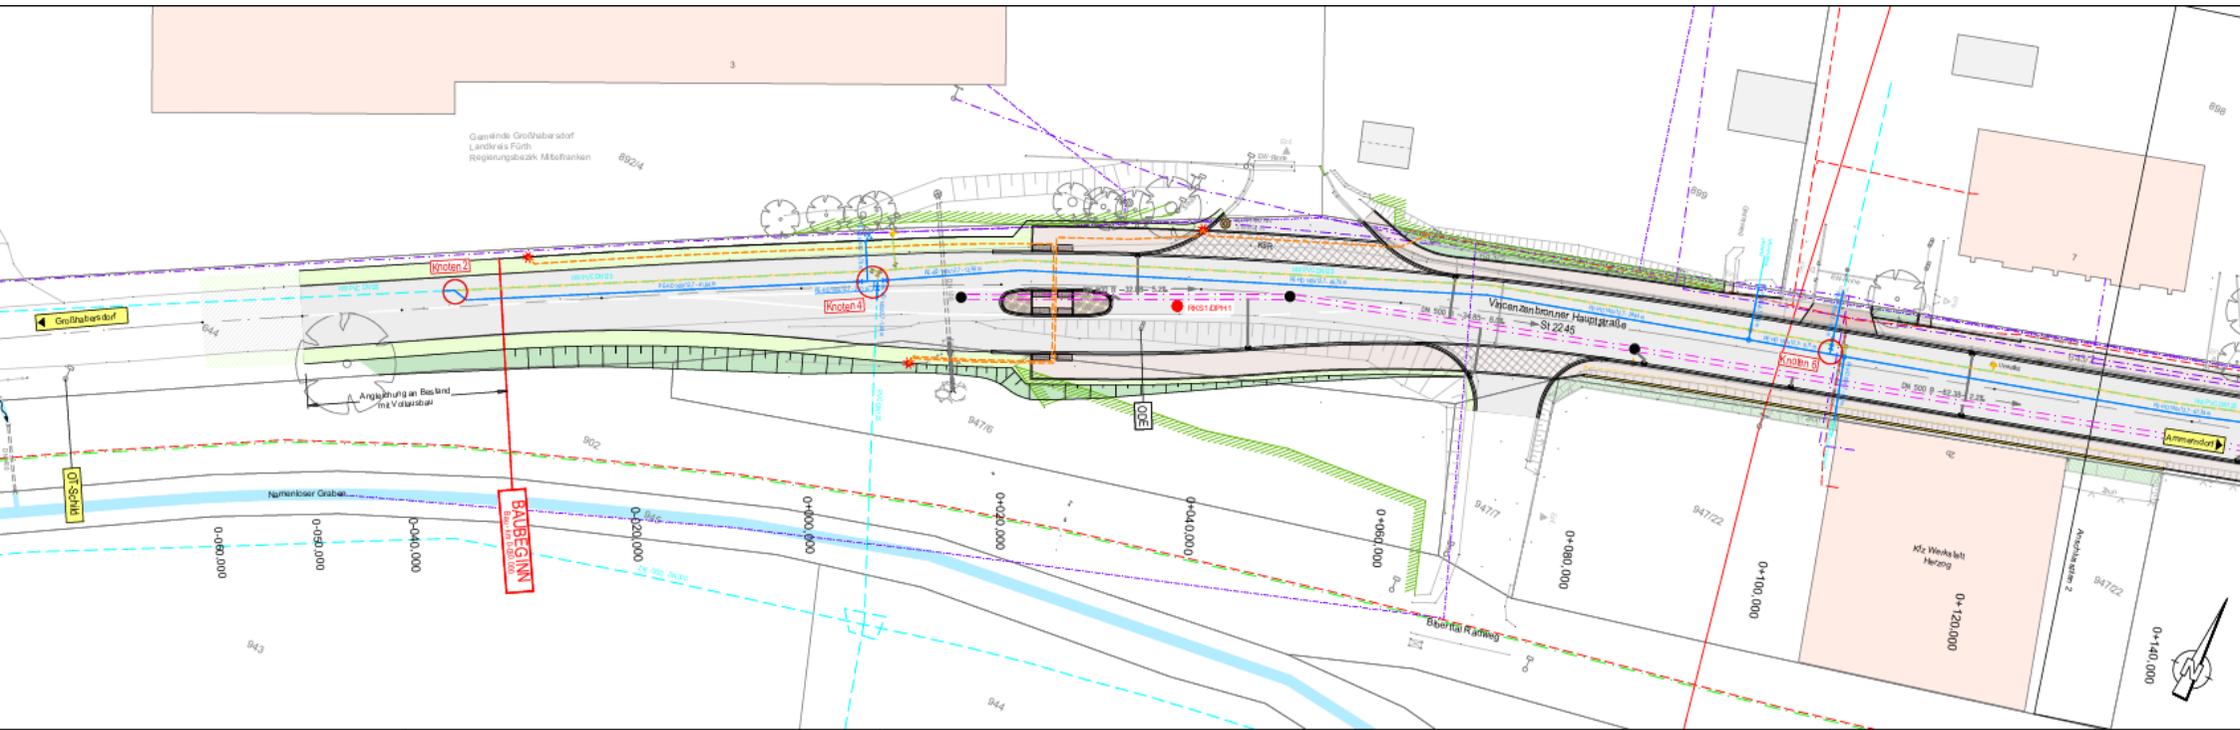

LP2, innerorts bis Fernabrünster Str.

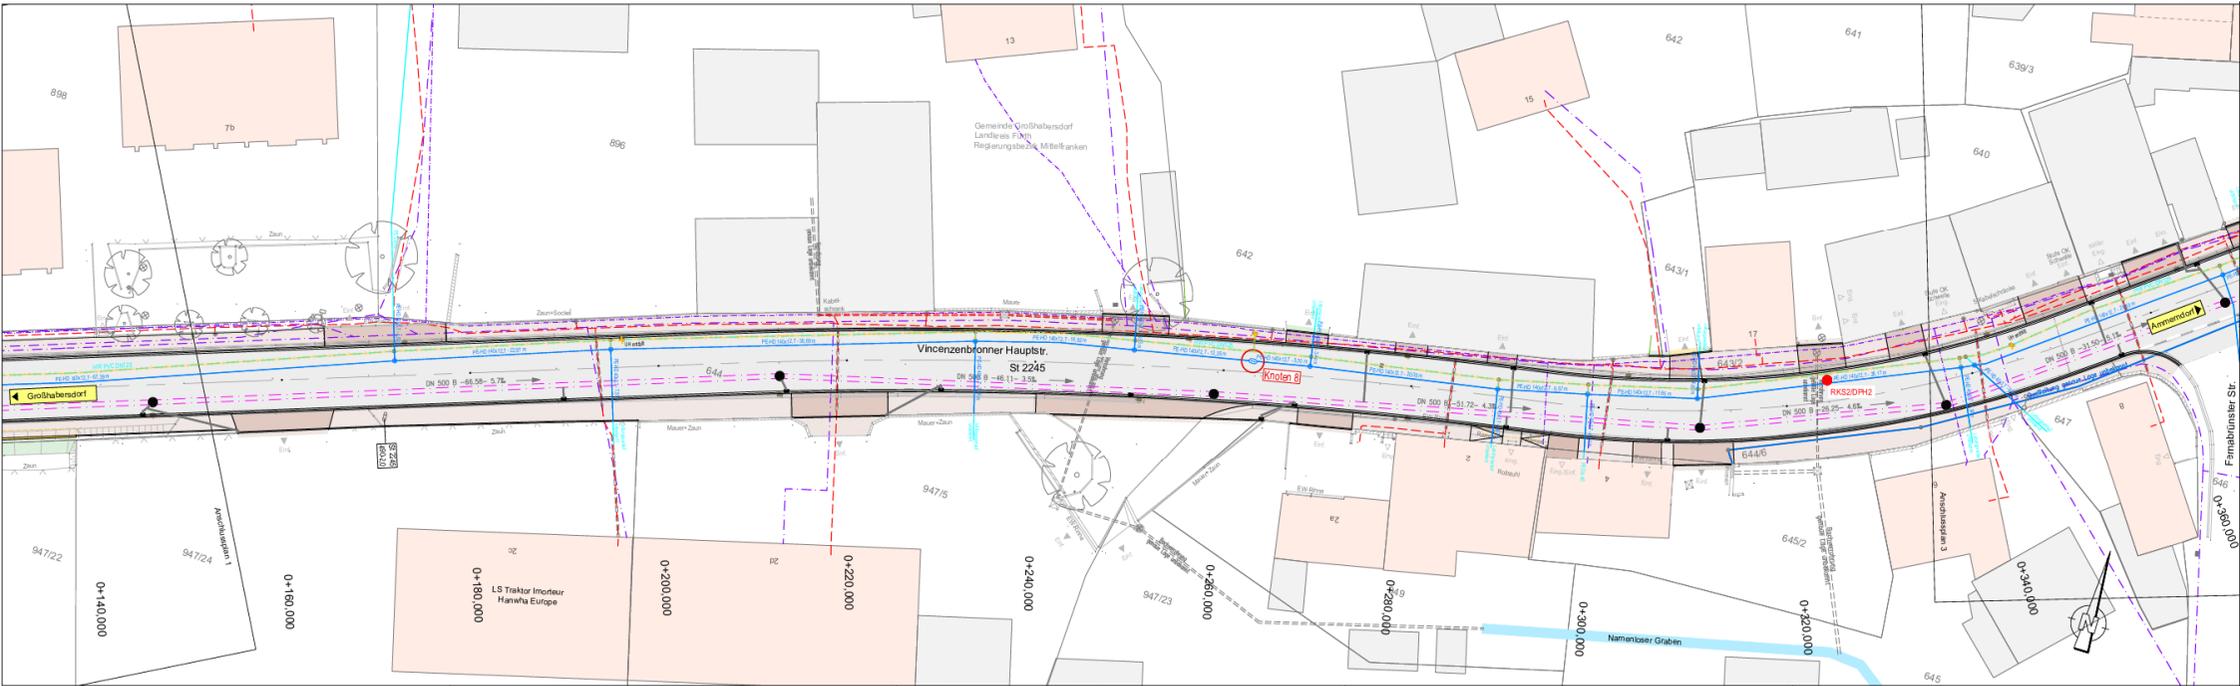

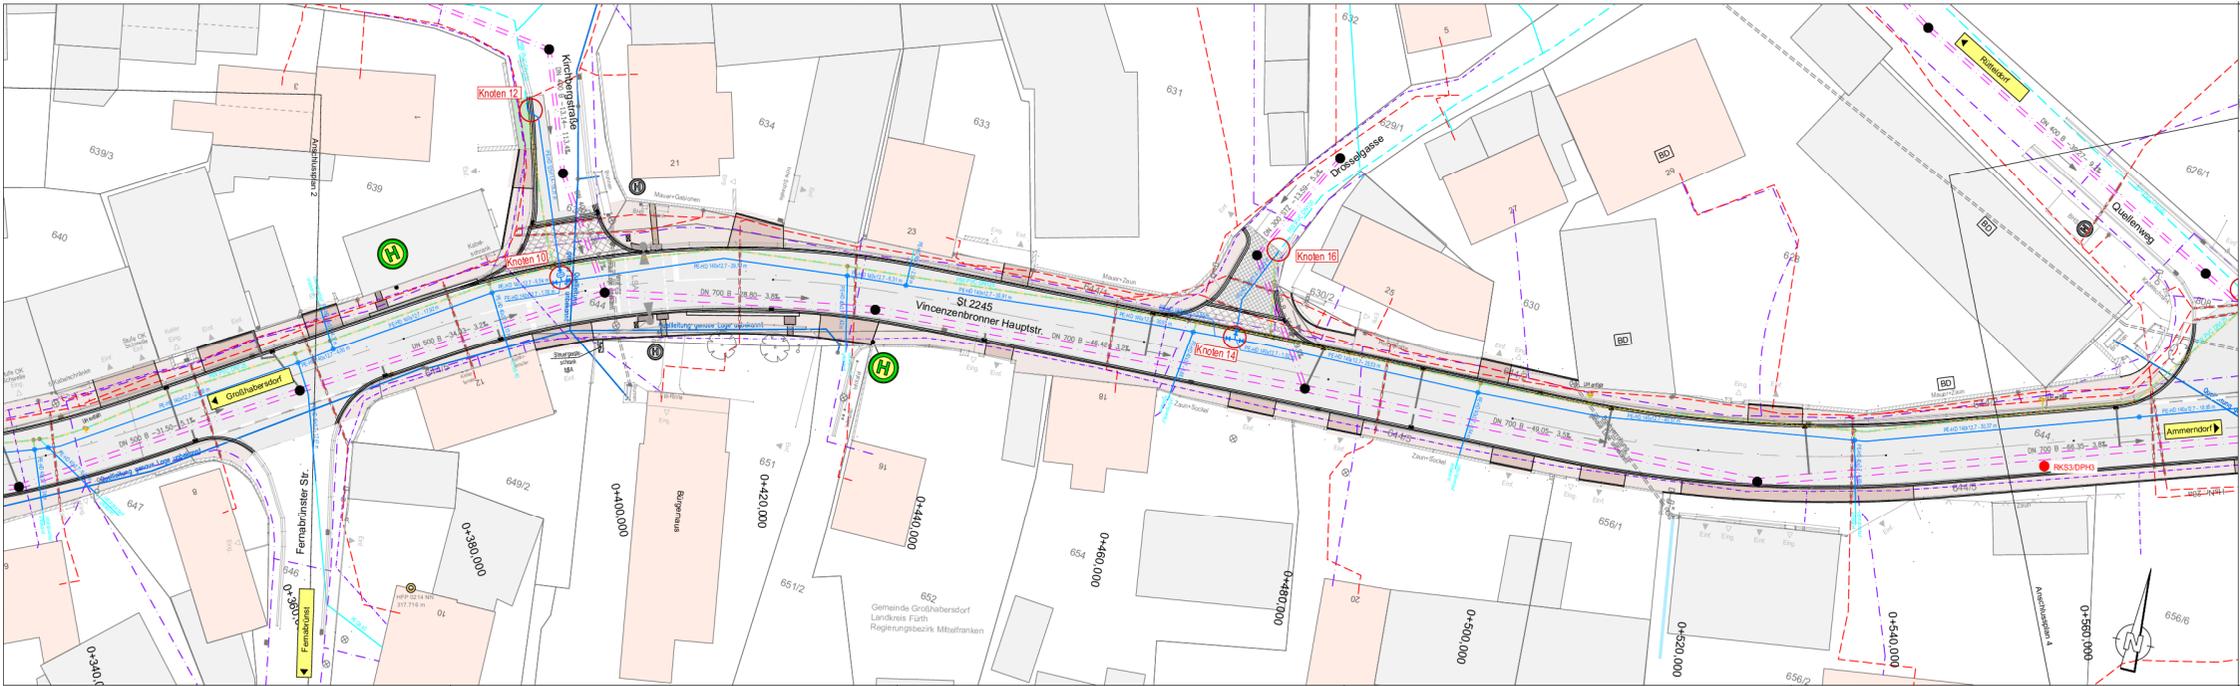

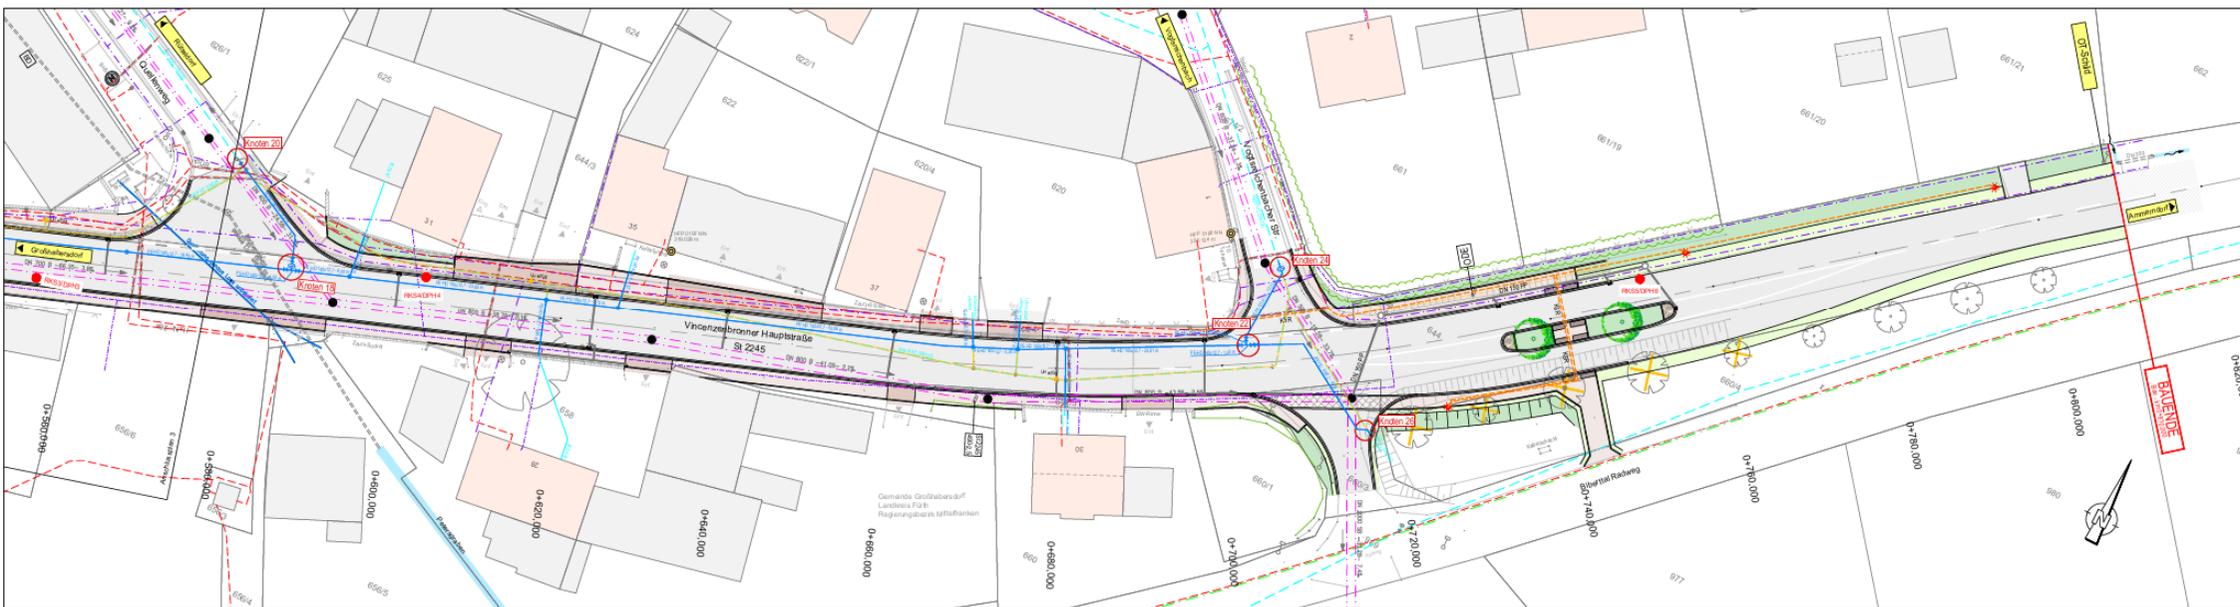


Übersicht Einzelgewerke



Folgende Einzelmaßnahmen werden durchgeführt:

- + Straßenbauarbeiten entlang des Straßenzuges „Vincenzenbronner Hauptstraße“, St2245 mit Errichtung zweier Fahrbahnteiler an den Ortseingängen
- + Gehwege durchgängig herstellen (i.A. Breite $B \geq 1,50\text{m}$)
- + Erneuerung / Sanierung der Trinkwasserversorgung
- + Bushaltestelle, barrierefrei (Kasseler Sonderbord)
- + Fußgängerquerung beim Bürgerhaus
Errichtung einer Fußgängerlichtsignalanlage

Bauabschnittsplan

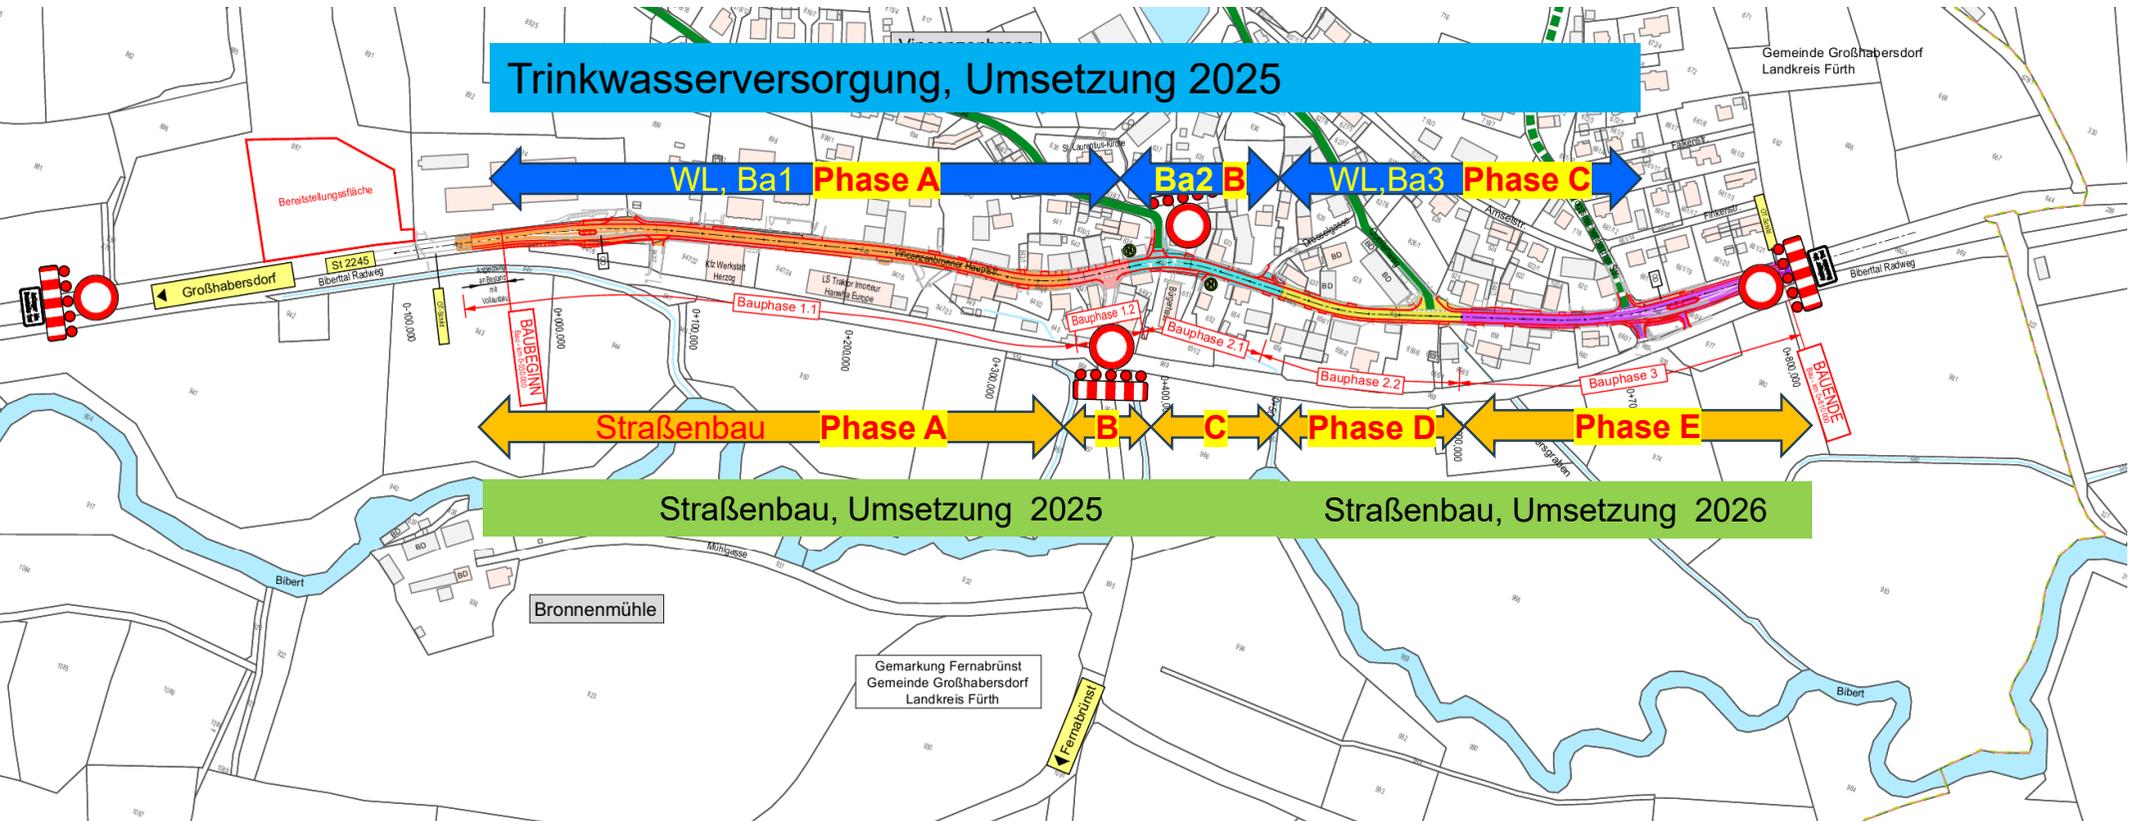


Übersicht Bauphasen



Der Ausbau „Ortsdurchfahrt Vincenzenbronn“ erfolgt in 5 Bauphasen:

Beginn:	16.06.2025 – 27.06.2025	(Umleitungen aufbauen, etc.)
Phase A (1.1):	30.06.2025 – 02.10.2025	(bis Fernabrünster Str.)
Phase B (1.2):	06.10.2025 – 17.10.2025	(Einm. Fernabrünster Str.)
Phase C (2.1):	20.10.2025 – 14.11.2025	(einschl. Einm. Drosselgasse)
Winterpause 17.11.2025 – 01.03.2026		
Phase D (2.2):	02.03.2026 – 27.03.2026	(bis einschl. Quellenweg)
Phase E (3):	23.03.2027 – 24.04.2026	
Ende:	bis 08.05.2026 Restarbeiten	

Umleitung, großräumig 30.06.2025 – 28.11.2025

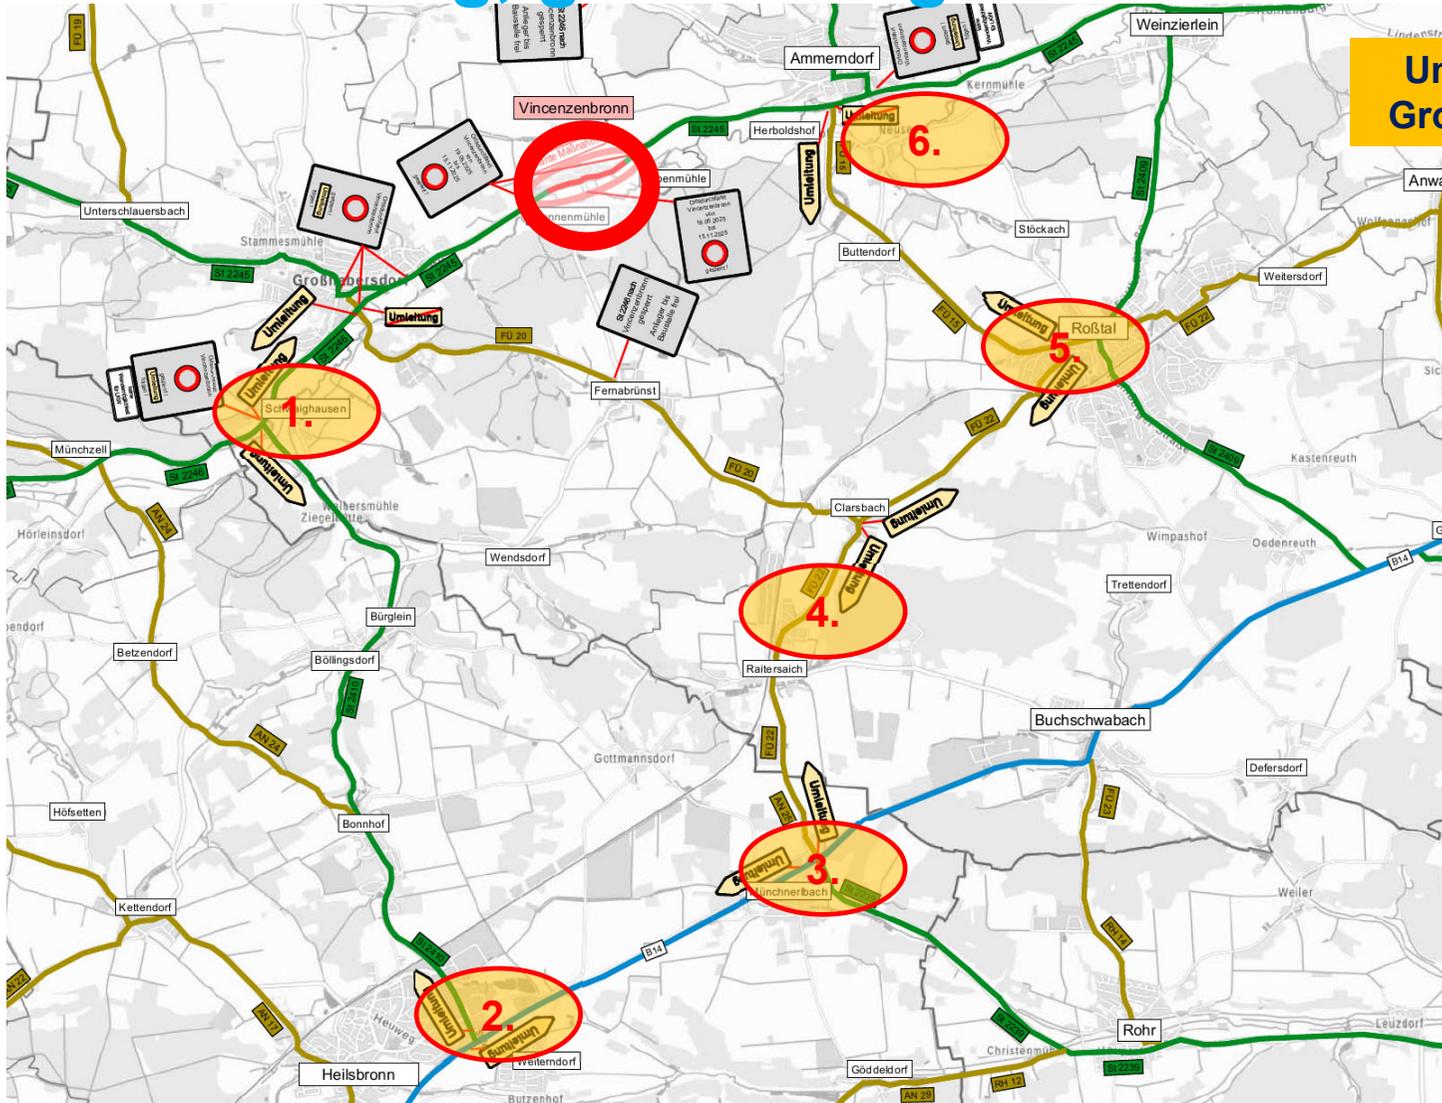

Umleitungsstrecke, St 2245 Großhabersdorf - Ammerdorf

1. Schwaighausen

2. Heilsbronn /
Weiterndorf

3. Münchnerlbach


4. Raitersbach /
Clarsbach

5. Roßtal

6. Ammerdorf

Anliegerumleitung

30.06.2025 - 14.11.2025
02.03.2026 - 24.04.2026

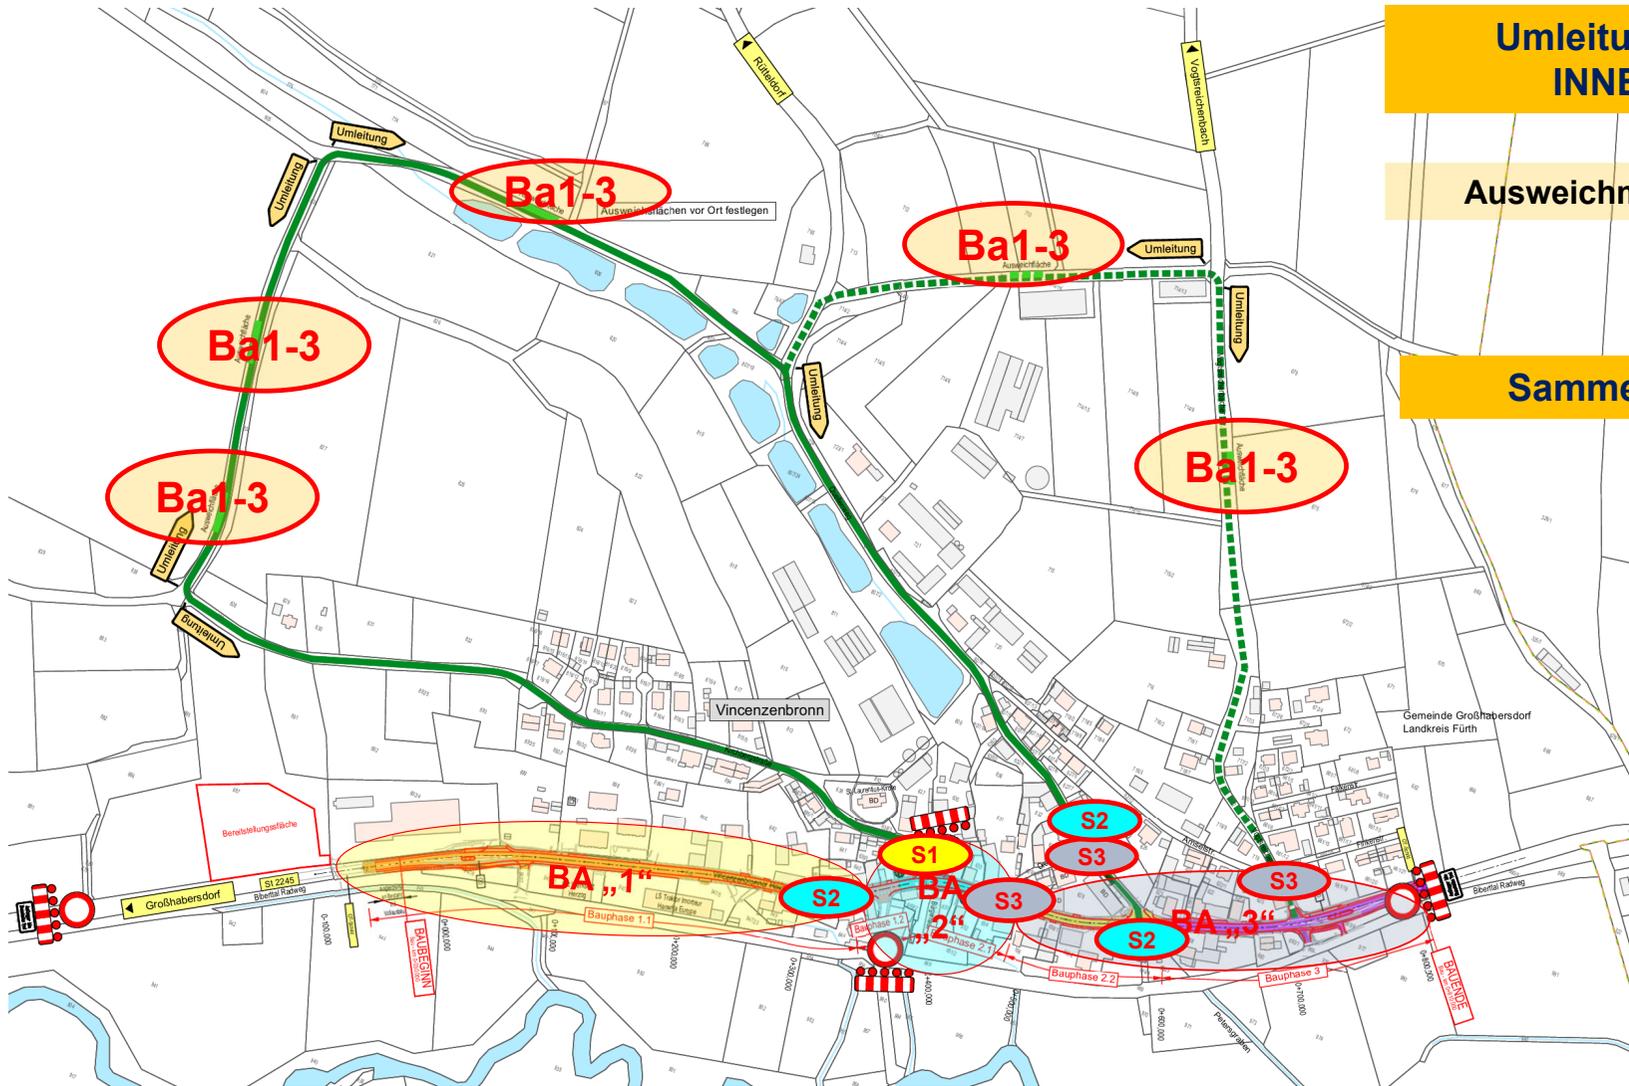

**Umleitungsstrecke
INNERORTS**

Ausweichmöglichkeiten

Sammelplatz, Müll

- BA 1
- Ba2
- Ba3

Müllsammelplatz – BA 1



Müllsammelplatz – BA2



Müllsammelplatz – BA 3





Zusammenfassung „Projekttablauf / Bauzeit“

Baubeginn der Gesamtmaßnahme erfolgt am: **30.06.2025**

Fertigstellung Straßenbau BA1+2, St2245 und
der Wasserversorgung bis: **28.11.2025**

Winterpause von 14.11.2025 bis ca. 01.03.2026

Straßenbau BA 2.2 + BA3 und Restarbeiten, bis: **08.05.2026**

Sperrung „Ortsdurchfahrt Vincenzenbronn“, von: **30.06. - 14.11.2025**
und von: **02.03. - 24.04.2026**

Abstimmung mit TÖB

Gemeinsam mit dem **Staatlichen Bauamt Nürnberg** und der **Gemeinde Großhabersdorf** wurde die anstehende Baumaßnahme auch insbesondere hinsichtlich

der: + Bauabschnittsbildung und Projektablauf / Zeitschiene
 + Verkehrsführung / Umleitung / Individualverkehr
 + Verkehrsführung / öffentlicher Nahverkehr / Schulbus
 + Verkehrsführung / Fußgänger

mit: => Landratsamt / Verkehrsbehörde
 => Polizei
 => Busunternehmen

abgestimmt.

Ausbau Ortsdurchfahrt Vincenzenbronn (St2245)

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit...
